



COMUNE DI RIESI (CL)

(Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta)


PROGETTO ESECUTIVO

Progetto di: Adeguamento, ristrutturazione e messa a norma del campo sportivo comunale.		Data: 29 Marzo 2018
		Scala:
22	Cronoprogramma	Il Sindaco: Dottor Salvatore Chiantia
Progettista : Per l'UTC Ing. Pasquale Amato		IL RUP : Geom. Mirella Giambarresi
		Disegno :

FASI	PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLA SINGOLA FASE ANNO 2018 - CRONOPROGRAMMA DELLE FASI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO "XI MARTIRI"-					
	(ogni casella corrisponde a dieci giorni)					
	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	
Consegna dei lavori (1g)						
Preparazione cantiere (6gg)						
demolizioni tramezzi, tamponamenti (5gg)						
Scavi per realizzare il piano inclinato di sottofondo, e la fondazioen dell'ampliamento dello spogliatoio (10gg)						
Spicconatura e sabbiatura muro di cinta e demolizione muri in tufo instabili						
Pavimentazione del campo marginale, formazione manto in erba sintetica sui sottofondi (30gg)						
Rustico dell'ampliamento spogliatoio, servizi infermeria e locale tecnico (30gg)						
Muro di cinta, recinzione, sistemazione tribuna coperta e impianto elettrico (30gg)						
Completamento pavimentazione campo da gioco marginale (10gg)						
Completamento finiture spogliatoi e servizi igienici e tribuna coperta (31gg)						
Completamento muro di cinta (20gg)						
rifacimento marciapiede esterno (11gg)						
Completamento Impianti elettrici spogliatoi, tribuna coperta, servizi igienici, infermeria, Locale tecnico (15gg)						
Completamento torre faro Impianto illuminazione (3gg)						
Realizzazione Campo Fotovoltaico (4gg)						
Fornitura accessori campo sportivo, arredi e messa in sicurezza contro gli urti (3gg)						
Pulizia cantiere (3gg)						
Chiusura dei lavori (1g)						
Collaudo e rendiconto (30gg)						

Diagramma di GANTT per la realizzazione del progetto: Sistemazione e adeguamento funzionamento campo di calcio “XI Martiri”

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	01/08/2018	02/08/2018	1
2	B	Preparazione cantiere	02/08/2018	08/08/2018	6
3	C.1	demolizioni tramezzi, tamponamenti	08/08/2018	13/08/2018	5
4	C.2	Scavi per realizzare il piano inclinato di sottofondo, e la fondazioen dell'ampliamento	13/08/2018	23/08/2018	10
5	C.3	Spicconatura e sabbiatura muro di cinta e demolizione muri in tufo instabili	23/08/2018	01/09/2018	9
6	D.1	Pavimentazione del campo marginale, formazione manto in erba sintetica sui sottofondi	01/09/2018	01/10/2018	30
8	D.2	Rustico dell'ampliamento spogliatoio, servizi infermeria e locale tecnico	01/09/2018	01/10/2018	30
9	D.3	Muro di cinta, recinzione, sistemazione tribuna coperta e impianto elettrico	01/09/2018	01/10/2018	30
10	E.1	Completamento pavimentazione campo da gioco marginale	01/10/2018	11/10/2018	10
11	E.2	Completamento finiture spogliatoi e servizi igienici e tribuna coperta	01/10/2018	01/11/2018	31
12	E.3	Completamento muro di cinta	01/10/2018	21/10/2018	20
13	E.4	rifacimento marciapiede esterno	21/10/2018	01/11/2018	11
14	F.1	Completamento Impianti elettrici spogliatoi, tribuna coperta, servizi igienici, infermeria, Locale tecnico	01/11/2018	16/11/2018	15
15	F.2	Completamento torre faro Impianto illuminazione	16/11/2018	19/11/2018	3
16	F.3	Realizzazione Campo Fotovoltaico	19/11/2018	23/11/2018	4
17	F.4	Fornitura accessori campo sportivo, arredi e messa in sicurezza contro gli urti	23/11/2018	26/11/2018	3
18	E.1	Pulizia cantiere	26/11/2018	29/11/2018	3
19	F.1	Chiusura dei lavori	29/11/2018	30/11/2018	1

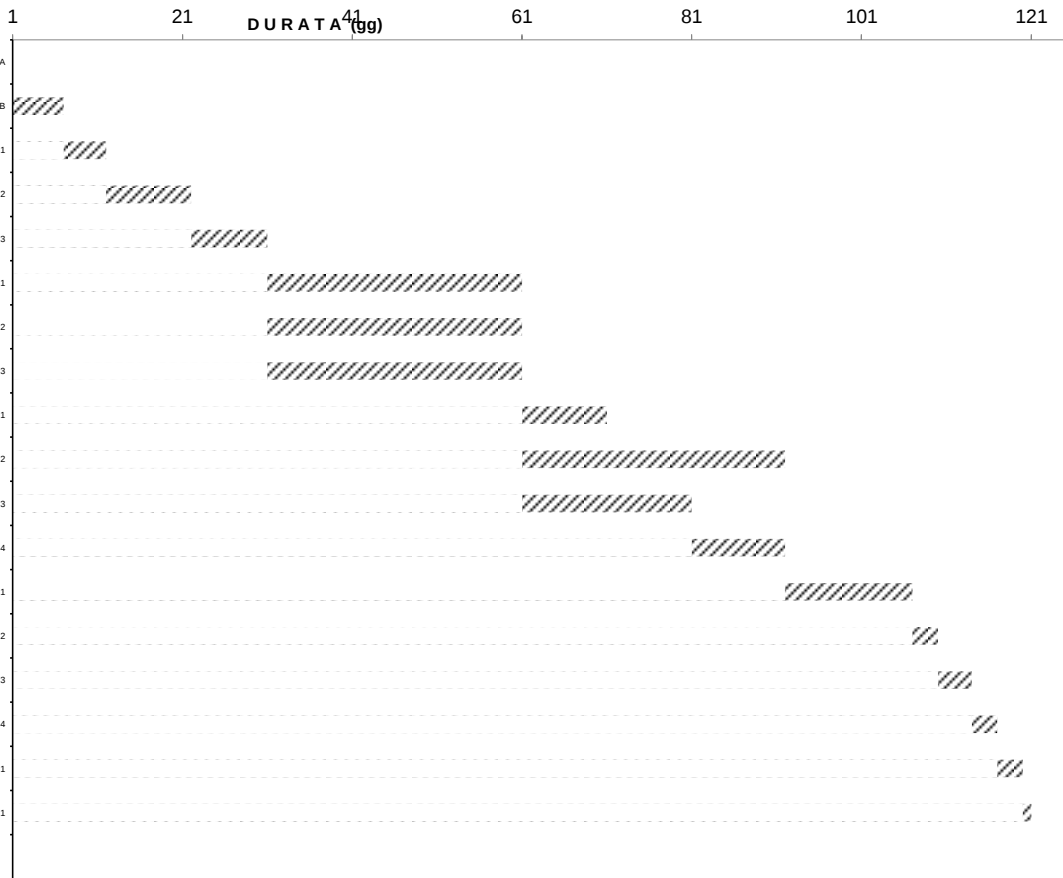

TC	121	gg.
	naturali consecutivi	

	Importi	Imp. Progressivi	giorni	giorni progressivi
preparazione cantiere	€ -	€ -	7	7
demolizioni tramezzi, tamponamenti	27.771,75	€ 27.771,75	5	12
Scavi per realizzare il piano inclinato di sottofondo, e la fondazioen dell'ampliamento dello spogliatoio	78.193,42	€ 105.965,17	10	22
Spicconatura e sabbiatura muro di cinta e demolizione muri in tufo instabili	43.527,53	€ 149.492,70	9	31
Pavimentazione del campo marginale, formazione manto in erba sintetica sui sottofondi	€ 245.853,81	€ 395.346,51	30	61
Rustico dell'ampliamento spogliatoio, servizi infermeria e locale tecnico	31.263,60	€ 426.610,11	30	61
Muro di cinta, recinzione, sistemazione tribuna coperta e impianto elettrico	75.620,66	€ 502.230,77	30	61
Completamento pavimentazione campo da gioco marginale	32.757,35	€ 534.988,12	10	71
Completamento finiture spogliatoi e servizi igienici e tribuna coperta	168.557,04	€ 703.545,16	31	92
Completamento muro di cinta	76.285,73	€ 779.830,89	20	81
rifacimento marciapiede esterno	16.421,11	€ 796.252,00	11	92
Completamento Impianti elettrici spogliatoi, tribuna coperta, servizi igienici, infermeria, Locale tecnico	€ 60.323,84	€ 856.575,84	15	107
Completamento torre faro Impianto illuminazione	37.837,48	€ 894.413,32	3	110
Realizzazione Campo Fotovoltaico	21.332,46	€ 915.745,78		
Fornitura accessori campo sportivo, arredi e messa in sicurezza contro gli urti	€ 25.453,88	€ 941.199,66	3	117
Pulizia cantiere		€ 941.199,66	3	120
Chiusura dei lavori		€ 941.199,66	1	121

